



B 244: Gemeinsame Presseinformation zu Bauarbeiten in Jerxheim-Bahnhof

Nach Verzögerungen im Bauablauf ist es ein gemeinsames Anliegen der Samtgemeinde Heeseberg, der Avacon Wasser GmbH und der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel über den aktuellen Stand der Bauarbeiten zu informieren und einen Ausblick zu geben.

Erster Meilenstein der beteiligten Akteure ist es zunächst die Befahrbarkeit der B 244 bis zur L 623 in Richtung Beierstedt schnellstmöglich wiederherzustellen und damit die Nutzung der „kleinen Umleitungstrecke“ zu ermöglichen. Damit ist im Frühsommer dieses Jahres zu rechnen.

Die in einer Presseinformation vom 04.11.2022 angekündigte Vollsperrung der B 244 ab 07.11.2022 hatte sich auf den Baubeginn und die Fertigstellung im Abschnitt 4 bezogen und möglicherweise falsche Hoffnungen bezüglich der Dauer der aktuellen Vollsperrung geweckt. Später kam es zu Verzögerungen im Bauablauf. Die einzelnen Bauabschnitte sind zur Veranschaulichung als Skizze beigefügt und werden wie folgt abgearbeitet.

Bauabschnitte 1, 2 und 4:

Derzeit konzentrieren sich die Arbeiten auf den Bereich der B 244 zwischen dem südlichen Ortseingang von Jerxheim-Bahnhof und der dort ansässigen Spedition (Bauabschnitt 1). Dies hat in beiden Richtungen eine großräumige Umleitung über Watenstedt, Barnstorf, Uehrde, Winnigstedt, Mattierzoll, Hessen (Sachsen-Anhalt), Rohrsheim (Sachsen-Anhalt) und Dedeleben (Sachsen-Anhalt) zur Folge. Anschließend wird sich der Bauabschnitt 2, für den die gleiche Umleitung genutzt werden muss. Bauabschnitt 4 wurde bereits in 2022 abgeschlossen.

Bauabschnitte 3.1, 3.2 und 5:


Nach Fertigstellung der südlichen Bauabschnitte beginnen zeitgleich die Arbeiten im Bereich der L 623-Einmündung und nördlich davon bis Jerxheim. Sobald dann im Frühsommer der Einmündungsbereich (Bauabschnitt 3.1) fertiggestellt ist, kann die kürzere Umleitung in Richtung Helmstedt ab Jerxheim-Bahnhof über die L 623 nach Beierstedt genutzt werden. Nördlich davon werden die Arbeiten in den Abschnitten 3.2 und 5 voraussichtlich bis zu den Sommerferien größtenteils beendet sein, sodass dann auch die dortige Vollsperrung aufgehoben werden kann.

Die Verzögerungen im derzeit laufenden Bauabschnitt 1 ergeben sich durch unvorhergesehene, zusätzliche Arbeiten an Versorgungsleitungen einhergehend mit einer längeren Bauzeit, die nicht mehr vor der Frostperiode im Dezember und der durch anhaltende Regenfälle geprägten Zeit im Januar und Februar abgeschlossen werden konnte.

L 623 Ortsdurchfahrt Jerxheim-Bahnhof:

Nach Fertigstellung der B 244 wird auch die L 623 erneuert. Der Auftrag ist seitens der Landesbehörde noch nicht vergeben.

Weitere Informationen hierzu, sowie zum Baufortschritt auf der B 244, folgen zu gegebener Zeit. Die Beteiligten bitten die betroffenen Anwohner und Verkehrsteilnehmer weiterhin um Verständnis.

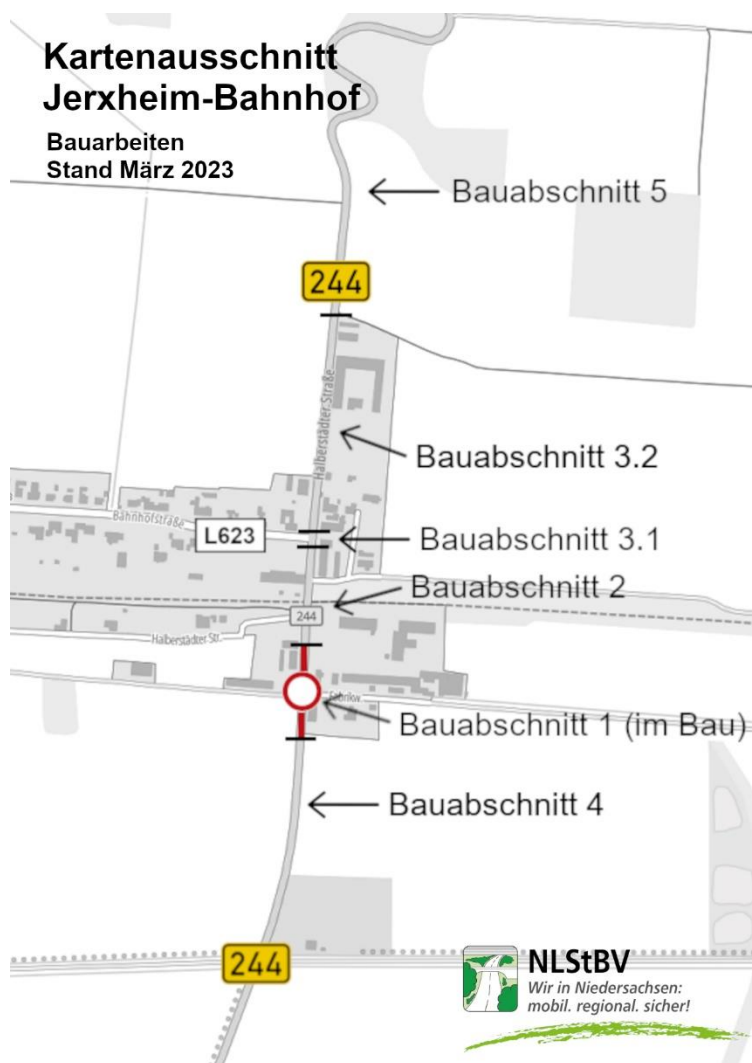

<p>Nr. 23014 – Volker Franck</p> <p>Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Geschäftsbereich Wolfenbüttel Sophienstraße 5, 38304 Wolfenbüttel</p>	<p>Tel. (05331) 8587-287 Fax (05331) 8587-299</p>	<p>www.strassenbau.niedersachsen.de pressestelle-wf@nlstbv.niedersachsen.de</p>
---	---	--
